



**À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO – ANM  
GERÊNCIA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS**

**Processo: 48403.002740/1947-67**

**À FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – FEAM  
GERÊNCIA DE BARRAGENS DE INDÚSTRIA E MINERAÇÃO**

**Processo: 2090.01.0001347/2022-77**

**AO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO  
SUSTENTÁVEL – SEMAD**

**AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS – MPMG**

**CENTRO DE APOIO OPERACIONAL AO MEIO AMBIENTE**

**Processo: 19.16.1248.0052926/2022-88**

**AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MPF**

**PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS**

**Processo: 1.22.000.001428/2022-71**

**Assunto:** Relatório trimestral de recursos empenhados nas atividades de descaracterização da Barragem B2 Auxiliar (período de referência: novembro de 2025 a janeiro de 2026) – Atendimento da Cláusula III, itens 4.1 e 4.3 do TC Descaracterização.

A **MINÉRIOS NACIONAL S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.294.881/0001-75, sediada na Rodovia Inconfidentes Km 40, s/nº, Zona Rural, Rio Acima/MG, vem, em atenção à Cláusula III, itens 4.1 e 4.3 do TC Descaracterização, apresentar relatório trimestral, referente aos recursos empenhados nas atividades relacionadas ao projeto de descaracterização da Barragem B2 Auxiliar, referente ao período de novembro de 2025 a janeiro de 2026.



Como se sabe, em 24 de fevereiro de 2022, a Minérios Nacional e os órgãos públicos ora compromitentes – MPMG, MPF e Estado de Minas Gerais (representado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente – FEAM e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD), bem como a Agência Nacional de Mineração (ANM) como interveniente, – firmaram Termo de Compromisso (“TC Descaracterização”), tendo como objeto a fixação de medidas necessárias de segurança e definição de procedimento para descaracterização das barragens B2 e B2 Auxiliar, de responsabilidade da Minérios Nacional, incluindo a Barragem B2 Auxiliar, objeto do presente relatório.

#### I. CLÁUSULA III, ITENS 4.1 e 4.3

De acordo com esse instrumento, a Minérios Nacional assumiu, na Cláusula III, item 4, a apresentar *“relatório técnico detalhado demonstrando todos os equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamentos destinados à execução dos trabalhos, bem como as respectivas garantias de execução”*, após 90 dias da contratação da auditoria independente. Após, mais especificamente nos subitens 4.1 e 4.3, a MIPE assumiu a obrigação de apresentar *“relatórios trimestrais atualizando a manutenção dos recursos necessários ao tempestivo e escorreito andamento dos trabalhos de descaracterização [...]”*.

Tendo em vista que o item 4, da Cláusula III, já foi atendido, a Minérios Nacional, em atendimento ao item 4.1, da referida cláusula, encaminha o relatório de atualização dos recursos empregados nas atividades de descaracterização referente ao período de novembro de 2025 a janeiro de 2026, subscrito pelos responsáveis técnicos e pela pessoa de maior hierarquia na estrutura corporativa da empresa, em atenção ao item 4.3, da Cláusula III (Anexo A).

É importante ressaltar que, em razão da multidisciplinariedade dos temas tratados neste relatório trimestral, não é técnica e juridicamente possível que este documento seja integralmente subscrito, em conjunto, pelos responsáveis técnicos do projeto e da execução da obra, considerando as diferentes atribuições das empresas envolvidas.

Assim, com o objetivo de atender ao previsto na Cláusula III, itens 4.1 e 4.3 do TC Descaracterização e preservar a respectiva competência e responsabilidade de cada uma dessas empresas, a Minérios Nacional encaminha em anexo o Relatório Trimestral de Recursos – Anexo A.

Além disso, a Minérios Nacional irá disponibilizar em seu sítio eletrônico o presente relatório, em atendimento ao item 4.3, da Cláusula III, no link: *“<https://www.csn.com.br/quem-somos/sustentabilidade/gestao-ambiental/>”*.



Por fim, a Companhia renova seus votos de mais alta estima, reforça seu compromisso de transparência e atuação focada na segurança das pessoas e do meio ambiente, e coloca-se à disposição para prestar todos os esclarecimentos que se façam necessários.

Congonhas, 24 de fevereiro de 2026.

---

MINÉRIOS NACIONAL S.A.

REVISÕES							
Nº	DESCRIÇÃO	EMPRESA	OS	DESENHADO	VERIFICADO	APROVADO	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	MIPE	-	GRO	FARM	TATSJ	24/02/2026
		ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	AUTORIZADO		DATA
		GRO	FARM	TATSJ	TATSJ		24/02/2026
		Nº DOCUMENTO:					REVISÃO
							<b>00</b>
				<p><b>ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MINÉRIOS NACIONAL, NÃO PODENDO SER COPIADO, REPRODUZIDO E FORNECIDO A TERCEIROS SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.</b></p>			
<p><b>ANEXO A -- RELATÓRIO TRIMESTRAL DE RECURSOS</b></p> <p><b>BARRAGEM B2 AUXILIAR – COMPLEXO FERNANDINHO</b></p> <p><b>NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026</b></p>							
ELABORADO		TOTAL DE FOLHAS	ESCALA	FORMATO	REVISÃO		
Gabriela Rosa Oliveira		<b>26</b>	<b>S/ESC</b>	<b>A4</b>	<b>00</b>		
VERIFICADO							
Felipe Augusto Ribeiro de Matos							
APROVADO – DATA							
Tadeu Antônio Torquato de Souza Junior – 24/02/2026							

## SUMÁRIO

1.1.	IDENTIFICAÇÃO .....	7
1.1.1.	Nome da barragem e da mina.....	7
1.1.2.	Coordenadas geográficas.....	7
1.1.3.	Identificação do empreendimento .....	8
1.1.4.	Identificação do empreendedor .....	8
1.1.5.	Identificação do responsável técnico pela barragem.....	9
1.2.	PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO .....	9
1.2.1.	Descrever sucintamente a concepção do projeto adotada para descaracterização da barragem	9
1.3.	HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS .....	12
1.4.	HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA E INDIRETA .....	14
1.5.	ORÇAMENTO E GARANTIAS DE EXECUÇÃO.....	18
1.6.	CRONOGRAMA .....	19
1.7.	PRODUTIVIDADE PREVISTA .....	21
1.8.	OFÍCIOS FEAM/SOLICITAÇÕES INTERTECHNE.....	21
1.9.	ASSINATURAS .....	24
1.10.	ANEXOS.....	25

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Identificação da estrutura (2024).....	7
Quadro 2 – Identificação do Empreendimento.....	8
Quadro 3 – Identificação do Empreendedor.....	9
Quadro 4 – Responsável Técnico pelo monitoramento, inspeção e manutenção pela barragem. ...	9
Quadro 5 – Histograma de Equipamentos.....	13
Quadro 6 – Histograma de Mão de Obra Direta e Indireta. ....	14
Quadro 8 – Orçamentos e Garantias de Execução. ....	18
Quadro 9 – Recomendações da auditora (Relatórios Trimestrais de Recursos).....	23

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Localização da Barragem B2A. ....	8
Figura 2 – Etapa 5 do projeto de descaracterização da barragem B2A. ....	10
Figura 3 – Última etapa do projeto de descaracterização da Barragem B2A. ....	11
Figura 4 – Arranjo geral do projeto de descaracterização da Barragem B2A. ....	12
Figura 5 – Gráfico dos equipamentos disponibilizados para as obras da Barragem B2A separados por empresas. ....	14
Figura 6 – Gráfico de mão de obra direta e indireta disponibilizados para as obras da Barragem B2A. ....	17
Figura 7 – Cronograma de descaracterização da Barragem B2 Auxiliar. ....	20

## 1.1. IDENTIFICAÇÃO

### 1.1.1. Nome da barragem e da mina

A identificação da estrutura que será descaracterizada pode ser visualizada no Quadro 1, conforme bancos de dados da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, e da Agência Nacional de Mineração – ANM (SIGBM).

Quadro 1 – Identificação da estrutura (2024).

<b>Nome da barragem <sup>1</sup></b>	Barragem B2 Auxiliar (B2A)
<b>ID da barragem <sup>1</sup></b>	477
<b>Empreendimento</b>	Minérios Nacional S.A.
<b>Complexo</b>	Fernandinho
<b>Endereço</b>	Rodovia dos Inconfidentes, km 40, s/nº, Zona Rural, Município de Rio Acima, Estado de Minas Gerais, CEP: 34.300-000

<sup>1</sup>Número de identificação da barragem no Sistema de Informações de Gerenciamento de Barragens – SIGIBAR  
Fonte: Informado no RISR 2/2024 elaborado pela SAFF Engenharia.

### 1.1.2. Coordenadas geográficas

As coordenadas da Barragem B2A foram referenciadas no Datum SIRGAS-2000 a partir do ponto central da barragem. A Figura 1 ilustra a localização da estrutura.

A Barragem B2A está situada no Complexo de Fernandinho da Minérios Nacional, no vale do córrego dos Trovões, no Município de Rio Acima, Estado de Minas Gerais, distante cerca de 47 km da cidade de Belo Horizonte, através da estrada BR-356.

As coordenadas Datum SIRGAS-2000 da Barragem B2A são: 7.769.879 N e 620.141 E (UTM).

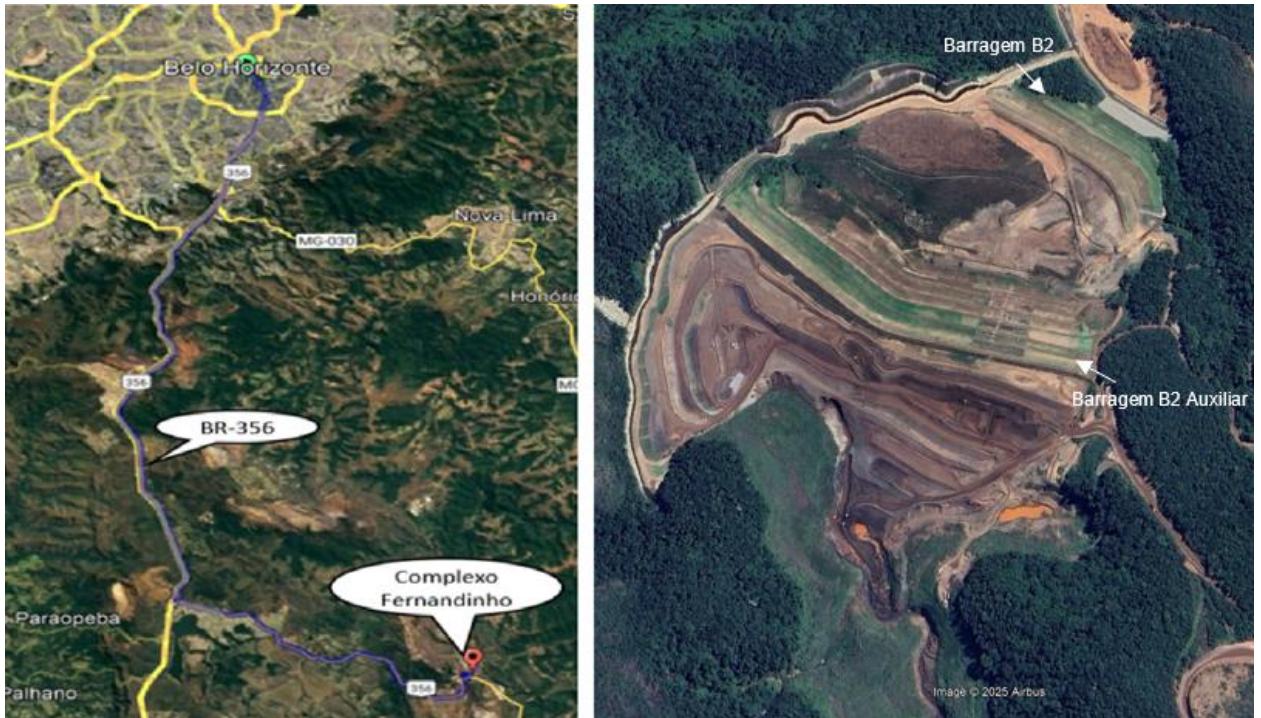


Figura 1 – Localização da Barragem B2A.  
 Fonte: Google Earth (30/04/2025).

### 1.1.3. Identificação do empreendimento

A Barragem B2A pertence à Minérios Nacional e está localizada na mina de Fernandinho. A mesma possuía a finalidade de armazenamento de rejeitos. A razão social, CNPJ, endereço, nome, telefone e profissão do representante legal para contato estão apresentados no Quadro 2.

Quadro 2 – Identificação do Empreendimento.

<b>Nome da estrutura</b>	Barragem B2 Auxiliar (B2A)
<b>Razão Social</b>	Minérios Nacional S.A.
<b>CNPJ</b>	09.294.881/0001-75
<b>Endereço</b>	Rodovia Inconfidentes, km 40, s/nº, Zona Rural, Município de Rio Acima, Estado de Minas Gerais, CEP: 34.300-000
<b>Representante legal</b>	Enéas Garcia Diniz
<b>Telefone</b>	(31) 3749-1210

Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica emitido no dia 04/02/2025 às 11:30:53.

### 1.1.4. Identificação do empreendedor

Os dados com a identificação do empreendedor estão apresentados abaixo no Quadro 3.

Quadro 3 – Identificação do Empreendedor.

<b>Nome da estrutura</b>	Barragem B2 Auxiliar
<b>Razão Social</b>	Minérios Nacional S.A.
<b>CNPJ</b>	09.294.881/0001-75
<b>Endereço</b>	Rodovia Inconfidentes Km 40, s/nº, Zona Rural, Rio Acima/MG, CEP: 34.300-000
<b>Representante legal</b>	Enéas Garcia Diniz
<b>Telefone</b>	(31) 3749-1210

Fonte: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica emitido no dia 04/02/2025 às 11:30:53.

### 1.1.5. Identificação do responsável técnico pela barragem

A identificação do responsável técnico pelo monitoramento e inspeção da barragem, sua formação profissional, número de registro de classe, endereço do correio eletrônico, e telefone para contato são apresentados no Quadro 4.

Quadro 4 – Responsável Técnico pelo monitoramento, inspeção e manutenção pela barragem.

<b>Responsável técnico pela barragem</b>	Rachel Gonçalves Braga
<b>Formação profissional</b>	Engenheiro Civil
<b>Responsabilidade</b>	Responsável técnico pela manutenção, inspeção e monitoramento
<b>CREA</b>	119.768/D MG
<b>E-mail/telefone</b>	<a href="mailto:rachel.braga@csn.com.br">rachel.braga@csn.com.br</a> / (31) 3749-1010

Fonte: Informações da ART do responsável técnico.

## 1.2. PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO

### 1.2.1. Descrever sucintamente a concepção do projeto adotada para descaracterização da barragem

O Projeto de Descaracterização da Barragem B2 Auxiliar (B2A) foi elaborado pela empresa DAM Projetos e contempla a implantação de um canal de cintura para o desvio do aporte das vazões afluentes ao reservatório da Barragem B2A em sua fase inicial, especialmente aquelas advindas do Córrego dos Trovões. Esta etapa foi concluída em 2018.

As etapas subsequentes do projeto de descaracterização da Barragem B2A são a remoção do rejeito do reservatório por montante com o objetivo de redução da linha freática no maciço, propiciando um cenário de aumento gradativo dos fatores de segurança da estrutura em todas as condições

solicitadas pelas normas vigentes, buscando assim a estabilidade da estrutura, para então realizar a sua descaracterização. Tal descaracterização baseia-se no princípio de se remover todos os alteamentos, bem como os rejeitos do reservatório da Barragem B2A.

A empresa Fonntes Geotécnica foi contratada para realizar o sequenciamento das atividades relacionadas ao projeto de estabilização/d Descaracterização da Barragem B2A com o objetivo de implementar, projetar e acompanhar tecnicamente as obras, além de realizar o Acompanhamento Técnico de Obras (ATO).

O projeto detalhado de descaracterização da Barragem B2A, elaborado pela Fonntes Geotécnica, manteve como princípio a remoção dos rejeitos e maciço da estrutura. O projeto foi concebido considerando-se seis etapas de escavação e rebaixamento do maciço, sendo a sexta etapa o término da descaracterização da barragem. Durante as cinco primeiras etapas é prevista a escavação do reservatório, rebaixamento do maciço e a manutenção dos taludes remanescentes do canal de cintura na margem esquerda, conforme Figura 2. Além disso, para estas etapas é previsto extravasor de emergência temporário dimensionado para PMP, em atendimento às resoluções ANM nº 95/2022 e ANM nº 130/2023, e mantida borda livre mínima de dois metros entre a crista do maciço e reservatório.

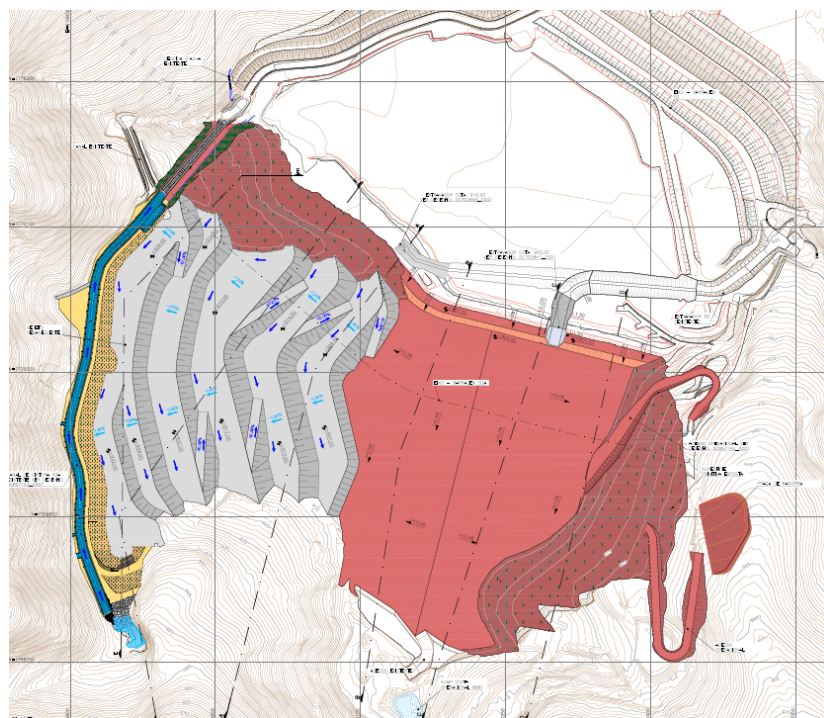


Figura 2 – Etapa 5 do projeto de descaracterização da barragem B2A.  
Fonte: Projeto elaborado pela Fonntes Geotécnica (04/2024).

Para a última etapa é previsto o desvio das águas do Córrego dos Trovões e Fazenda Velha por meio no novo canal de cintura a ser construído na margem direita, de forma que se permita a remoção dos rejeitos remanescentes da margem esquerda e conclua a descaracterização da barragem, conforme Figura 3. Ressalta-se que para todas as etapas segue-se as diretrizes de atendimento aos fatores de segurança para a condição estática, condição não drenada de pico e condição pseudoestática.

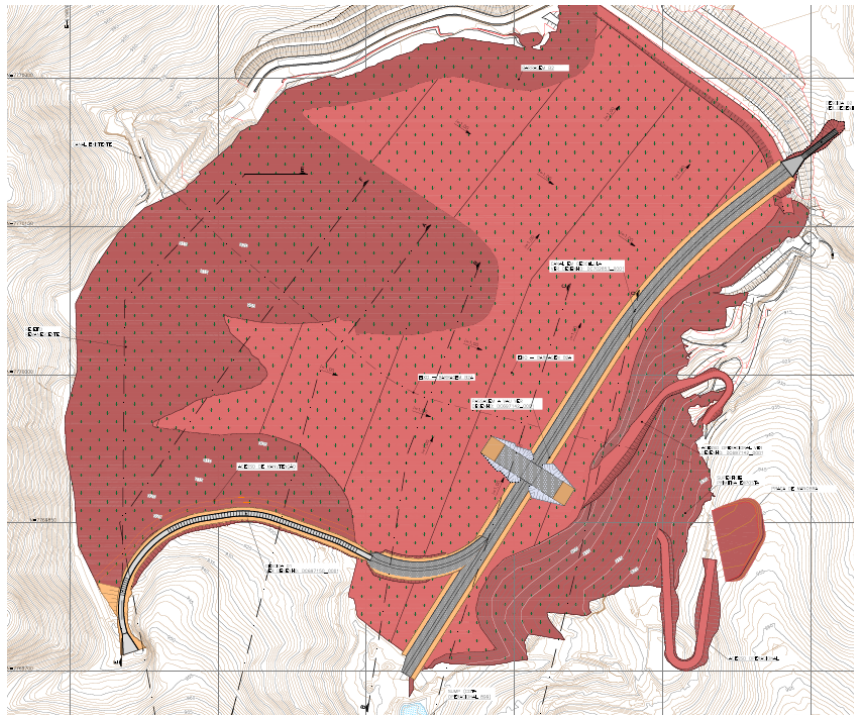


Figura 3 – Última etapa do projeto de descaracterização da Barragem B2A.  
Fonte: Projeto elaborado pela Fontes Geotécnica (04/2024).

Neste contexto, no período de maio a julho de 2025 o projeto foi reformulado com o intuito de otimizar a solução de engenharia atendendo às resoluções e normas vigentes, compatibilizando a segurança geotécnica e hidráulica da estrutura com o cumprimento dos prazos legais estabelecidos pela ANM. Para isso, foi definido como premissa o desmonte parcial da estrutura, mantendo-se seis etapas de rebaixamento originalmente definidas. Em cada fase de rebaixamento foi projetado um respectivo sistema de drenagem superficial e um sistema extravasor temporário associado em atendimento à resolução ANM nº 95/2022 e ANM nº 130/2023, com exceção da etapa final. No cenário final terá sido removido parcialmente o maciço da B2A em seu vale central até a elevação da berma El. 899,0 m. O referido projeto foi protocolado junto à FEAM em 19 de novembro de 2025 em resposta ao ofício FEAM/GBM nº. 848/2025.

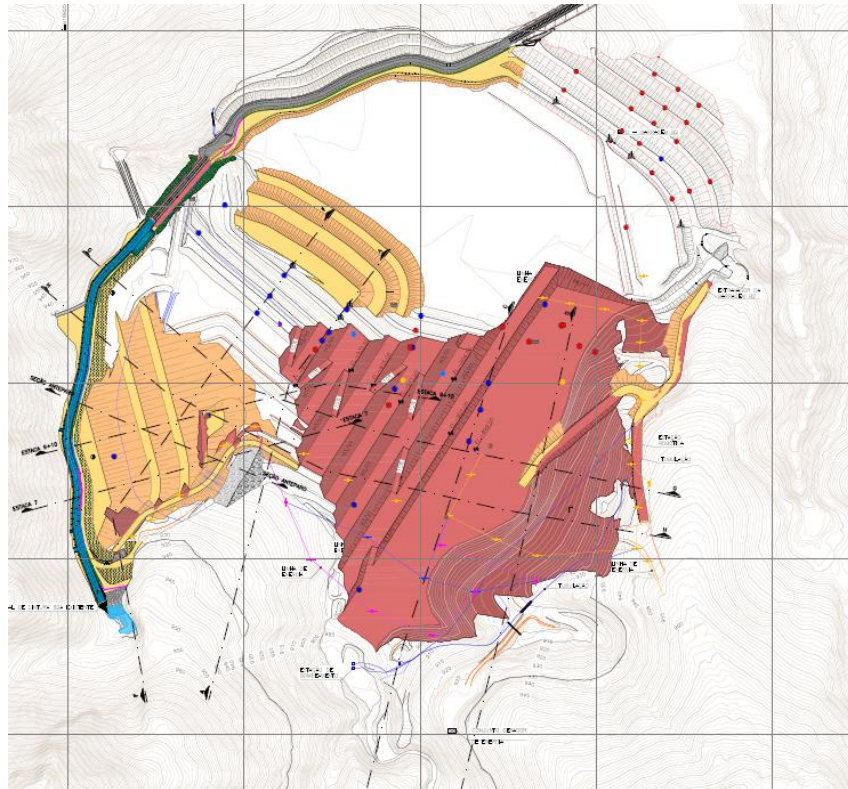


Figura 4 – Arranjo geral do projeto de descaracterização da Barragem B2A.  
Fonte: Projeto elaborado pela Fontes Geotécnica (08/2025).

É importante ressaltar que em 30 de dezembro de 2025 foi protocolado na FEAM o relatório “TR\_Descadastramento” (protocolo n.º 130426609) juntamente com a documentação requerida, informando o fim das obras de descaracterização da Barragem B2A, solicitando seu descadastramento.

### 1.3. HISTOGRAMA DE EQUIPAMENTOS

Os equipamentos disponibilizados estão listados no Ressalta-se que as obras de descaracterização da Barragem B2A foram finalizadas em dezembro/2025.

Quadro 5, enquanto na Figura 5 é possível visualizar a distribuição dos recursos por empresa. Ressalta-se que as obras de descaracterização da Barragem B2A foram finalizadas em dezembro/2025.

Quadro 5 – Histograma de Equipamentos.

EQUIPAMENTOS - BARRAGEM B2A			
Equipamento	Quantitativo		
	nov/25	dez/25	jan/26
Ambulância	1	1	
Banheiro Químico	20	21	
Bomba D'água	1	1	
Caminhão Basculante	35	35	
Caminhão Comboio	1	1	
Caminhão Munck	1	1	
Caminhão Pipa	2	2	
Carreta Prancha	1	1	
Container	8	8	
Escavadeira Hidráulica 20t	1	1	
Escavadeira Hidráulica 35t	5	4	
Gerador	7	7	
Guarita	4	4	
Motoniveladora	1	1	
Ônibus	2	2	
Pá Carregadeira	1	1	
Torre De Iluminação	8	8	
Trator De Esteiras	3	3	
Veículos 4x4	2	2	
Veículos Leves	4	4	
Equipamento de topografia	1	1	
Rolo compactador	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>0</b>
<i>FONNTES (ATO)</i>			
Veículo utilitário 4x4 (SUV)	2	2	
Veículo passageiro	2	2	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<i>ECOAR (Monitoramento Hídrico mensal)</i>			
Veículo utilitário 4x4	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>AMBIENTE VIVO (Monitoramento Hídrico diário/semanal)</i>			
Veículo utilitário 4x4	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>Minérios Nacional S.A.</i>			
Veículo utilitário 4x4 (SUV) - Equipe Geotecnia	1	1	1
Veículo passageiro - Equipe Projetos	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Fonte: Informações consolidadas pela equipe de projetos da Minérios Nacional.

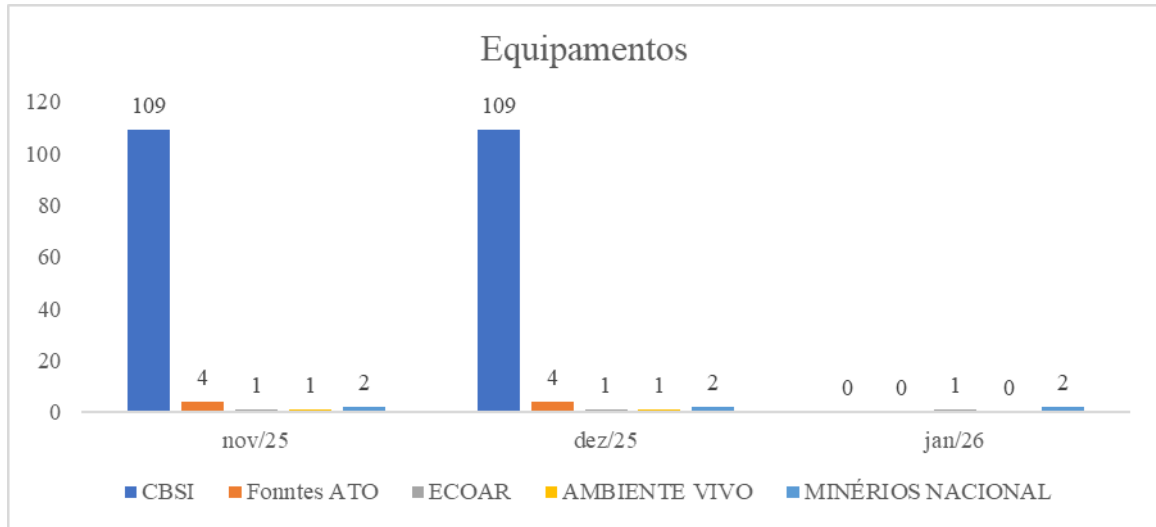


Figura 5 – Gráfico dos equipamentos disponibilizados para as obras da Barragem B2A separados por empresas.

Fonte: Informações consolidadas pela equipe de projetos da Minérios Nacional.

#### 1.4. HISTOGRAMA DE MÃO DE OBRA DIRETA E INDIRETA

No Quadro 6 estão relacionadas as mãos de obras utilizadas no período de referência do relatório e na Figura 6 é apresentada uma distribuição quantitativa para os três meses.

Quadro 6 – Histograma de Mão de Obra Direta e Indireta.

BARRAGEM B2A			
MÃO DE OBRA DIRETA E INDIRETA	Quantitativo		
	nov/25	dez/25	jan/26
<i>CBSI</i>			
AJUDANTE I	20	18	
AJUDANTE MANUTENCAO CIVIL I	5	5	
ANALISTA ADMINISTRATIVO PL	1	0	
ANALISTA MEDICAO JR	0	0	
ANALISTA PLANEJAMENTO JR	1	1	
ARMADOR I	2	2	
ARMADOR II	5	6	
ARMADOR III (VOLTA REDONDA)	1	3	
ASSISTENTE DE MEDIÇÃO	1	1	
ASSISTENTE GENTE GESTAO III	1	1	
ASSISTENTE MEDICAO	1	1	
ASSISTENTE TECNICO OPERACIONAL I	1	1	
AUXILIAR ALMOXARIFADO	1	1	

AUXILIAR LIMPEZA INDUSTRIAL	0	0	
AUXILIAR LIMPEZA SOCIAL	2	1	
AUXILIAR SERVICOS APOIO	1	1	
AUXILIAR TOPOGRAFIA	2	2	
CARPINTEIRO I	2	4	
CARPINTEIRO II	0	2	
CARREGADEIRA / ESCAVADEIRA / TRATOR DE ESTEIRA	1	0	
COORDENADOR OBRAS	1	1	
ELETRICISTA FORCA CONTROLE I	4	5	
ELETRICISTA MANUTENCAO I	8	7	
ENCARREGADO OBRAS II	6	6	
ENCARREGADO TURMA (VOLTA REDONDA)	0	0	
ENGENHEIRO CIVIL	1	1	
ENGENHEIRO ESPECIALISTA	1	1	
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO	1	1	
ENGENHEIRO SEGURANCA TRABALHO	0	0	
ESPECIALISTA DESENVOLVIMENTO TECNICO	0	0	
FERRAMENTEIRO	1	1	
LIDER MATERIAIS	1	1	
LUBRIFICADOR	3	3	
MECANICO MANUTENCAO I	1	1	
MOTORISTA CAMINHAO BASCULA	1	1	
MOTORISTA CAMINHÃO BASCULA	64	62	
MOTORISTA CAMINHÃO BASCULA/ ENCARREGADO TRANSPORTE	1	1	
MOTORISTA CAMINHÃO BASCULA/ PIPA	1	1	
MOTORISTA CAMINHÃO BASCULA/ VEICULO LEVE	4	4	
MOTORISTA CAMINHÃO BASCULA/ VEICULO LEVE (APOIO ELETRICA)	1	1	
MOTORISTA CAMINHÃO COMBOIO	1	1	
MOTORISTA CAMINHÃO MUNCK	2	2	
MOTORISTA CAMINHÃO PIPA	3	3	
MOTORISTA CAMINHÃO PRANCHA	0	0	
MOTORISTA SOCORRISTA	2	2	
NIVELADOR	1	1	
OPERADOR CAMINHÃO MUNCK	1	0	
OPERADOR CAMINHÃO PIPA	2	1	
OPERADOR CARREGADEIRA/ ESCAVADEIRA/ TRATOR ESTEIRA	1	1	
OPERADOR DE TRATOR PNEU/ VEICULO LEVE (APOIO ELETRICA)	1	1	
OPERADOR ESCAVADEIRA	9	11	
OPERADOR ESCAVADEIRA/ CARREGADEIRA	1	1	
OPERADOR MOTONIVELADORA	2	3	
OPERADOR PÁ CARREGADEIRA	1	2	

OPERADOR RETROESCAVADEIRA	0	0	
OPERADOR TRATOR DE ESTEIRA	2	0	
OPERADOR TRATOR ESTEIRA	3	4	
OPERADOR TRATOR ESTEIRA/ ESCAVADEIRA	1	1	
PÁ CARREGADEIRA	0	0	
PEDREIRO I	2	1	
PEDREIRO I (VOLTA REDONDA)	1	3	
PEDREIRO II	0	2	
PROFISSIONAL MANUTENCAO CIVIL I	3	3	
SOLDADOR MACARIQUEIRO I	1	1	
SUPERVISOR CONTROLE QUALIDADE	1	1	
SUPERVISOR ELÉTRICA	1	1	
SUPERVISOR LOGISTICA	1	1	
SUPERVISOR TECNICO	2	2	
SUPERVISOR TECNICO (VOLTA REDONDA)	0	1	
TECNICO CONTROLE QUALIDADE I	0	0	
TECNICO DE MEIO AMBIENTE I	1	1	
TECNICO ENFERMAGEM TRABALHO	2	2	
TECNICO PLANEJAMENTO I	2	2	
TECNICO SEGURANCA TRABALHO I	2	3	
TOPOGRAFO	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>201</b>	<b>207</b>	
<i>INTERTECHNE (Auditoria)</i>			
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<i>WN (EDR)</i>			
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<i>FONNTES (ATO)</i>			
Topógrafo	1	1	
ATO	2	2	
Auxiliar de Topografia	2	2	
Sismógrafo	3	3	
Técnico de Segurança	1	1	
Auxiliar de limpeza	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
<i>FONNTES (Engenharia)</i>			
Engenheiro Projetista	1	1	
Engenheiros	2	2	
Engenheiro Geotécnico	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
<i>ECOAR (Monitoramento Hídrico mensal)</i>			
Técnico de Meio Ambiente	1	1	1

Coletor	2	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<i>AMBIENTE VIVO (Monitoramento Hídrico diário/semanal)</i>			
Analista de Meio Ambiente	3	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<i>Minérios Nacional S.A.</i>			
Gerente de Projetos	1	1	1
Coordenador de Projetos	1	1	1
Engenheiro Geotécnico	4	4	4
Engenheiro	1	1	1
Assistente Técnico	1	1	1
Técnico de Projeto	2	2	2
Técnico de Meio Ambiente	1	1	1
Topógrafo	2	2	2
Auxiliar de Topografia	2	2	2
Gerente de Geotecnia	1	1	1
Engenheiro Geotécnico	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>

Fonte: Informações consolidadas pela equipe de projetos da Minérios Nacional.

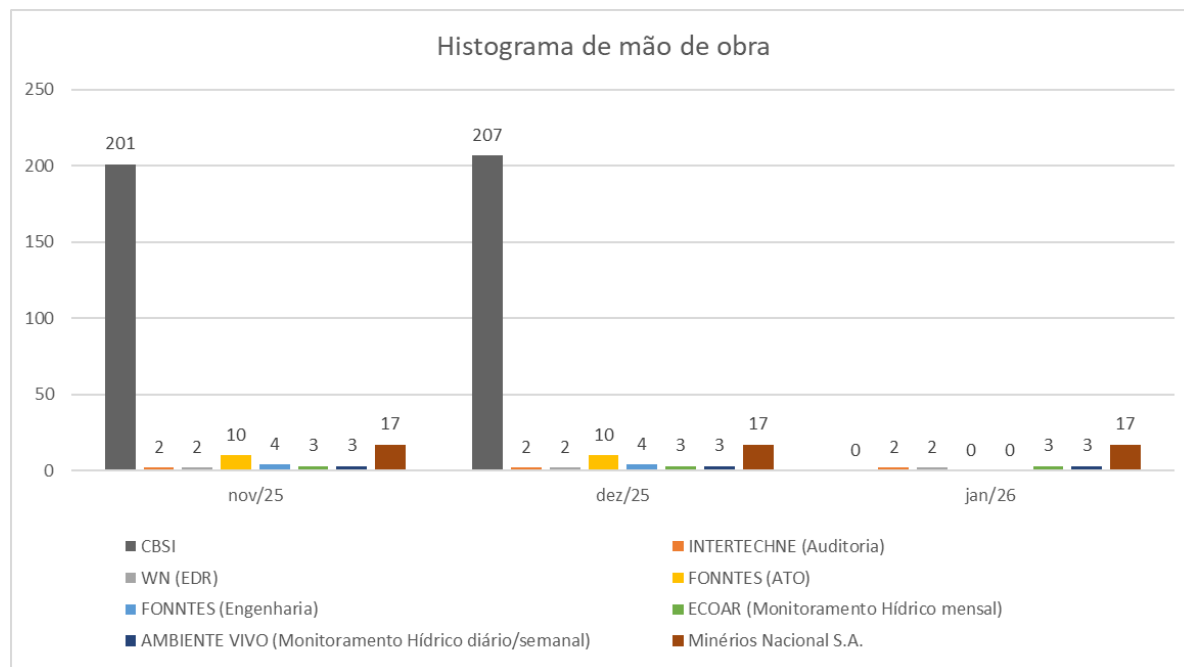


Figura 6 – Gráfico de mão de obra direta e indireta disponibilizados para as obras da Barragem B2A.

Fonte: Informações consolidadas pela equipe de projetos da Minérios Nacional.

## 1.5. ORÇAMENTO E GARANTIAS DE EXECUÇÃO

No período de novembro de 2025 a janeiro de 2026 houve atividades relacionadas as ações efetivas para a garantia da manutenção e segurança da estrutura e descaracterização da Barragem B2A e do projeto de descaracterização desenvolvido pela empresa Fontes Geotécnica. Portanto, os recursos disponibilizados são informados no Quadro 7.

Quadro 7 – Orçamentos e Garantias de Execução.

ESTRUTURA	EMPRESA	SERVIÇO	NOV/25	DEZ//25	JAN/25	TOTAL TRIMESTRE
B2A	INTERTECHNE	Auditória Externa de Barragens	R\$111.718,15	R\$ 58.485,15	R\$ 58.485,15	
	WN	EDR - Análise de Desempenho das Barragens	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	
	FONNTES GEOTÉCNICA	Engenharia e ATO das adequações das Barragens de Fernandinho - Fase 4	R\$ 306.433,84	R\$ 299.106,02	R\$ **	
	CBSI	Implantação das adequações das Barragens de Fernandinho - Fase 4 Etapa 2	R\$ 7.103.343,60	R\$ 9.583.194,42	R\$ **	<b>R\$ 17.870.246,89</b>
	HEAD 5	Crosscheck Engenharia detalhada	R\$ 13.059,37	R\$ 26.118,74	R\$ 8.706,25	
	ECOAR	Monitoramento hídrico mensal	R\$ 3.126,07*	R\$ 3.126,07*	R\$ 3.126,07*	
	AMBIENTE VIVO	Monitoramento hídrico diário/semanal	R\$ 71.862,75*	R\$ 71.862,75*	R\$ 82.662,75*	
	CONSULTORIA TBRETAS	Auditória Externa de Barragens	-	-	R\$ 37.329,74	

\*Custo compartilhado com demais estruturas.

\*\*Obra finalizada em dezembro/2025. Recurso de janeiro é referente a descaracterização da Barragem B2, e estará presente no referido relatório da estrutura.

Fonte: Informações consolidadas pela equipe de projetos da Minérios Nacional.

## 1.6. CRONOGRAMA

A seguir, apresenta-se na Figura 7 o cronograma com a evolução das atividades da Barragem B2A. Atualmente as atividades em questão apresentam um avanço de 100%, em virtude da conclusão das obras de descaracterização da estrutura em dezembro de 2025.

No Anexo I encontra-se o cronograma das atividades na Barragem B2A Fase IV – Etapa 2, executadas pela contratada CBSI.

**DESCOMISSONAMENTO DAS BARRAGENS DE FERNANDINHO**

LEGENDA: CRONOGRAMA CORRENTE



ATIVIDADES	INÍCIO	TÉRMINO
<b>FASE 1 - BARRAGEM B2A</b>	jan-18	dez-18
<b>MOBILIZAÇÃO</b>	jan-18	mar-18
<b>OBRAS CANAL DE CINTURA B2</b>	mar-18	dez-18
<b>OBRAS BARRAGEM ECOLÓGICA I</b>	fev-18	dez-18
<b>FASE II - BARRAGEM B2A</b>	nov-18	abr-21
<b>OBRAS ECOLÓGICA II</b>	nov-18	jul-19
<b>OBRAS BARRAGEM B2</b>	nov-18	jan-19
<b>OBRAS BARRAGEM B2A</b>	jan-19	abr-19
<b>ESCAVAÇÃO SUMP B2A</b>	jul-19	abr-21
<b>FASE III - BARRAGEM B2A</b>	out-20	mai-23
<b>ESTABILIZAÇÃO DA BARRAGEM B2A</b>	out-20	mai-23
<b>CONTRATAÇÃO ENGENHARIA ATO - FASE III</b>	out-20	mar-21
<b>ENGENHARIA ATO / OBRAS CIVIS - FASE III</b>	mar-21	mai-23
<b>MOBILIZAÇÃO DE REVURSOS</b>	jan-23	mai-23
<b>OBRAS EMERGÊNCIAIS BARRAGENS B2 E B2A</b>	jan-22	fev-22
<b>ESTABILIZAÇÃO DA BARRAGEM B2A</b>	abr-21	mai-23
<b>PARALISAÇÃO - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO 1</b>	jun-21	nov-21
<b>PARALISAÇÃO - MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO 2</b>	jun-22	mai-23
<b>CONCLUSÃO DAS OBRAS PREVISTAS PARA FASE III</b>	mai-23	mai-23
<b>FASE IV - BARRAGEM B2A</b>	abr-22	dez-25
<b>ETAPA I</b>	jul-22	jun-24
<b>CONTRATAÇÃO ENGENHARIA BÁSICA E DETALHADA</b>	jul-22	jun-23
<b>DESENVOLVER ENGENHARIA BÁSICA E DETALHADA</b>	jun-23	jun-24
<b>CONTRATAÇÃO IMPLANTAÇÃO</b>	jul-22	mai-23
<b>EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO (OBRAS CIVIS)</b>	mai-23	jun-24
<b>CONCLUSÃO IMPLANTAÇÃO (OBRAS CIVIS)</b>	jun-24	jun-24
<b>ETAPA II</b>	ago-23	dez-25
<b>CONTRATAÇÃO ENGENHARIA BÁSICA E DETALHADA</b>	ago-23	jul-24
<b>DESENVOLVER ENGENHARIA BÁSICA E DETALHADA</b>	jul-24	set-25
<b>CONTRATAÇÃO IMPLANTAÇÃO</b>	out-23	mai-24
<b>EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO (OBRAS CIVIS)</b>	mai-24	dez-25
<b>CONCLUSÃO IMPLANTAÇÃO (OBRAS CIVIS)</b>	dez-25	dez-25
<b>FASE V - BARRAGEM B2 (ATUAL)</b>	out-23	mai-28
<b>CONTRATAÇÃO ENGENHARIA</b>	jan-24	mai-25
<b>DESENVOLVER ENGENHARIA</b>	mai-25	mai-26
<b>CONTRATAÇÃO IMPLANTAÇÃO</b>	out-23	mai-24
<b>EXECUÇÃO IMPLANTAÇÃO (OBRAS CIVIS)</b>	out-25	mai-28
<b>CONCLUSÃO IMPLANTAÇÃO (OBRAS CIVIS)</b>	mai-28	mai-28

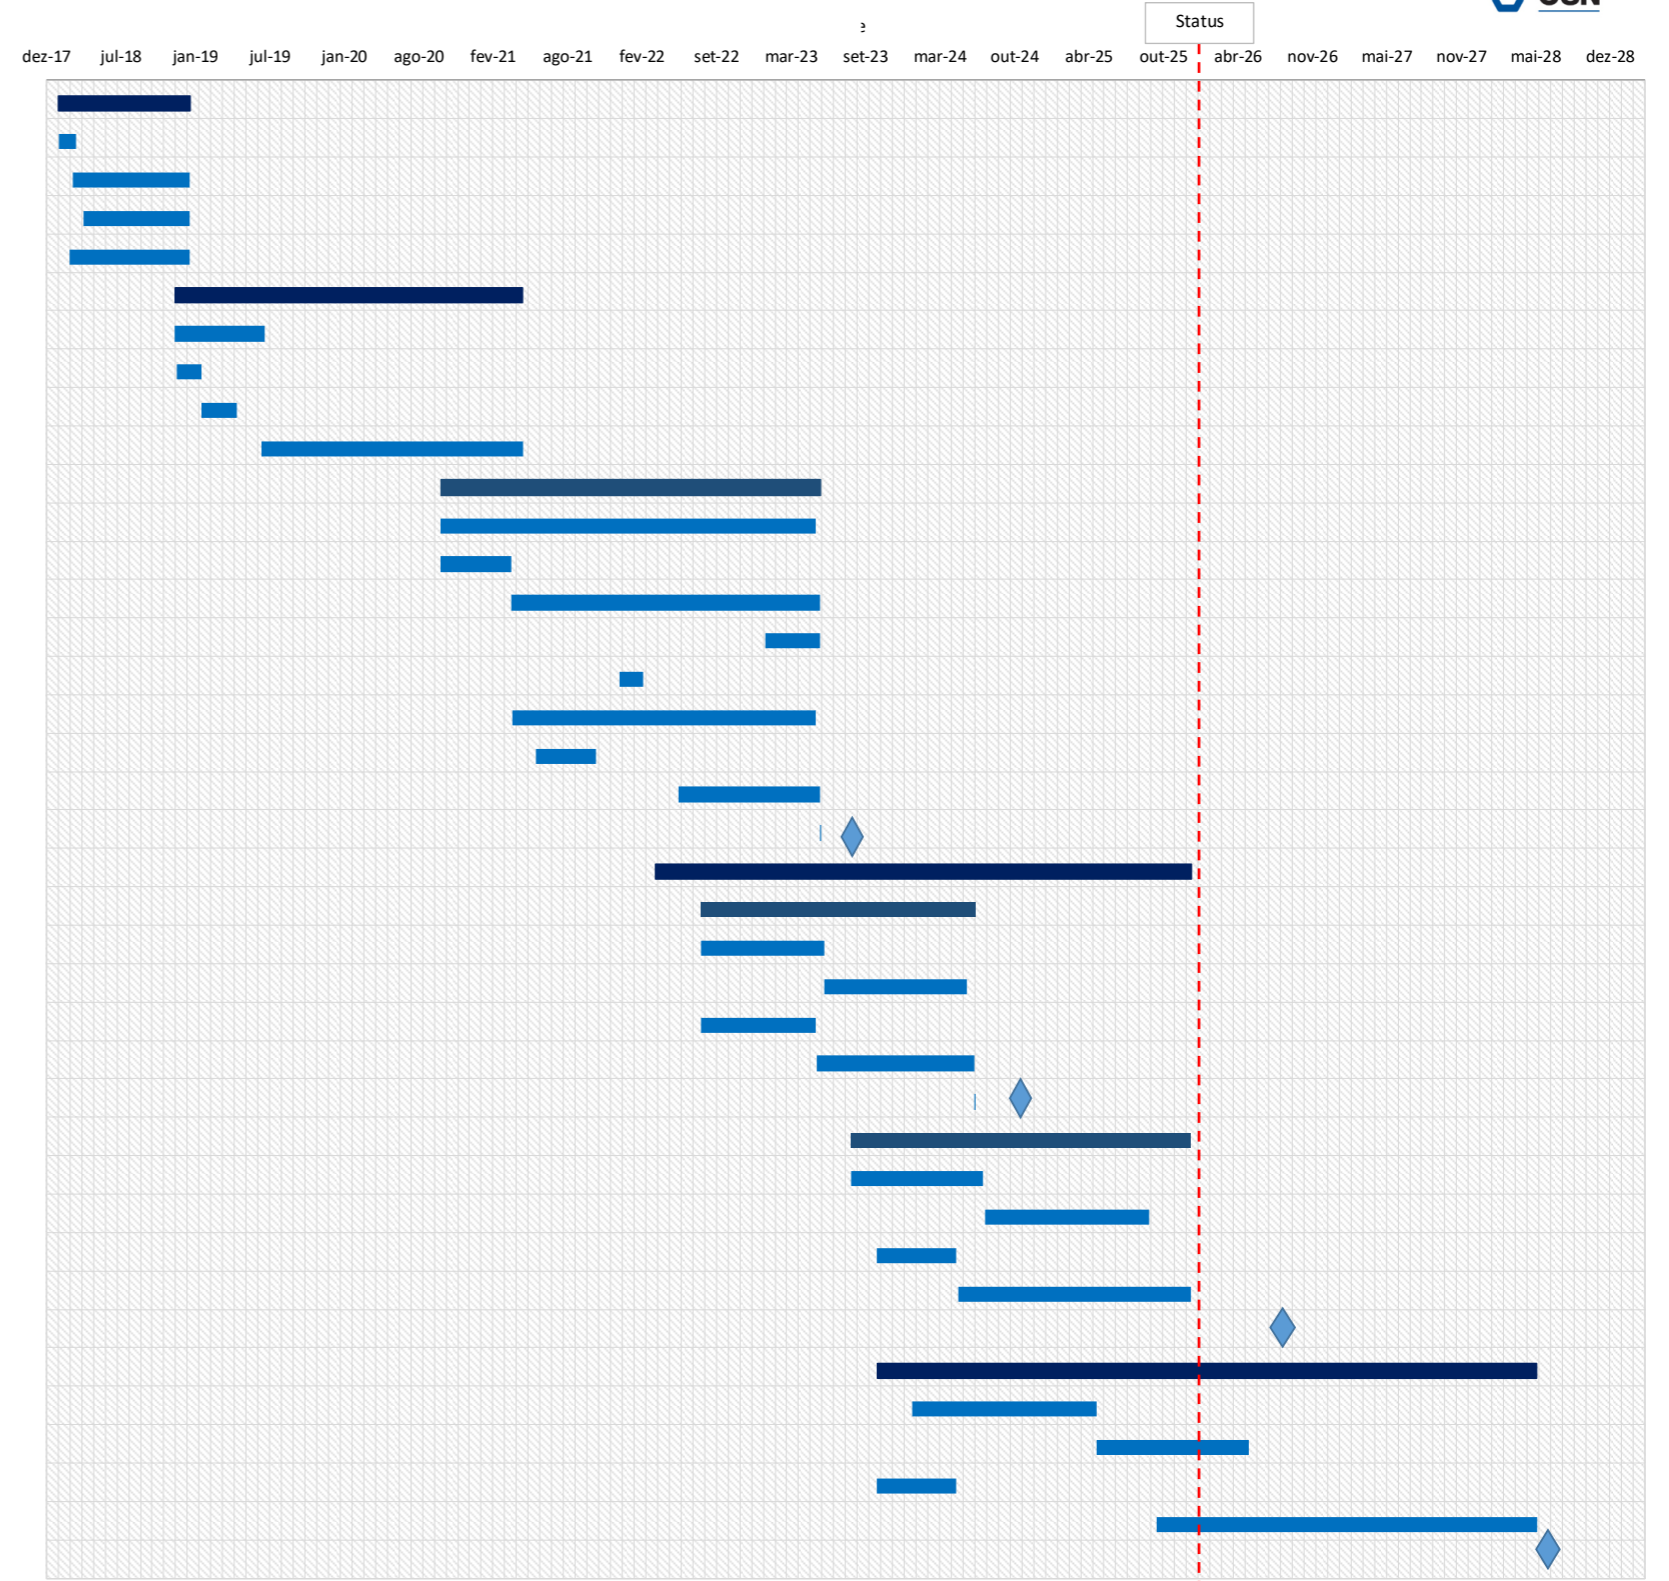


Figura 7 – Cronograma de descaracterização da Barragem B2 Auxiliar.  
Fonte: Elaborado pela equipe de projetos da Minérios Nacional.

## 1.7. PRODUTIVIDADE PREVISTA

O quantitativo de equipamentos previstos para o pico da execução das atividades na Barragem B2A, de acordo com o cronograma acima, é de:

- 35 Caminhões basculante;
- 5 Escavadeiras;
- 1 Caminhão comboio;
- 1 Pá carregadeira;
- 1 Caminhão Munck;
- 2 Caminhões pipa;
- 2 Tratores; e
- 1 Motoniveladora.

Ressalta-se que durante o período das obras de descaracterização da Barragem B2A, houve uma média de 270 viagens por dia destinadas ao transporte do material removido da estrutura (maciço e reservatório).

## 1.8. OFÍCIOS FEAM/SOLICITAÇÕES INTERTECHNE

Conforme Ofício FEAM/NUBAR nº 686/2023, recebido pela Minérios Nacional no dia 18/07/2023, foi indicado que este documento deverá trazer tópico específico abordando o cumprimento das recomendações da auditora elencadas nessa nota técnica e, para aquelas que não forem cumpridas, a justificativa ou o cronograma para a sua realização.

Em e-mail de esclarecimentos com a FEAM, restou definido que: os prazos fixados nas Notas Técnicas pela Intertechne teriam como “Data da solicitação” o dia em que a empresa tomou conhecimento da exigência.

Em consonância com o Ofício FEAM-GBM 499-2025, emitido pela FEAM e recebido pela Minérios Nacional no dia 17/06/2025, foi indicado que este documento deverá trazer tópico específico abordando o cumprimento das recomendações da auditora Intertechne elencadas nessa nota técnica e, para aquelas que não forem cumpridas, a justificativa ou o cronograma para a sua realização.

Em consonância com o Ofício FEAM-GBM 500-2025, emitido pela FEAM e recebido pela Minérios Nacional no dia 17/06/2025, foi indicado que este documento deverá trazer tópico específico abordando o cumprimento das recomendações da auditora Intertechne elencadas nessa nota técnica e, para aquelas que não forem cumpridas, a justificativa ou o cronograma para a sua realização.

Em consonância com o Ofício FEAM-GBM 721-2025, emitido pela FEAM e recebido pela Minérios Nacional no dia 21/08/2025, foi indicado que este documento deverá trazer tópico específico abordando o cumprimento das recomendações da auditora Intertechne elencadas nessa nota técnica e, para aquelas que não forem cumpridas, a justificativa ou o cronograma para a sua realização.

Conforme o Ofício FEAM/GBM nº 971/2025, emitido pela FEAM e recebido pela Minérios Nacional no dia 15/12/2025, foi indicado que este documento deverá trazer tópico específico abordando o cumprimento das recomendações da auditora Intertechne elencadas nessa nota técnica e, para aquelas que não forem cumpridas, a justificativa ou o cronograma para a sua realização.

Deste modo, as recomendações apontadas pela Intertechne, nas avaliações dos relatórios de recursos são apresentadas no Quadro 8 juntamente com o status atual do atendimento e as ações que estão sendo tomadas pela Minérios Nacional.

Quadro 8 – Recomendações da auditora (Relatórios Trimestrais de Recursos).

<b>Barragem B2A - Controle de Ações - Relatórios Trimestrais de Recursos</b>						
Nº	Prioridade	Descrição	Data solicitação	Data limite	Status	Observações Minérios Nacional
1	Alta	Detalhar o cronograma, com apresentação de cada uma das atividades previstas e executadas na execução do projeto de descaracterização, divididas por fase de projeto. Alocar os recursos por atividade, com as respectivas produtividades de equipe e equipamentos, bem como o quantitativo de horas trabalhadas efetivamente. O cronograma deve ser apresentado em formato que possibilite avaliar impactos de uma atividade em outra. Incluir os percentuais de avanço físico-financeiro referente aos serviços previstos.	28-abr-23	15-jul-23	Atendido	A Minérios Nacional vem esclarecer que o detalhamento deste cronograma é realizado em conjunto com a empresa contratada para a execução das obras, onde é apontado os itens referentes à produtividade, quantidade de equipamentos e mão de obra necessários para o cumprimento do projeto. Sendo assim, a Minérios Nacional apresentou no item 1.7 deste relatório os cronogramas referentes aos processos em andamento de forma detalhada, assim como o cronograma macro do complexo de Fernandinho. O cronograma é apresentado no Anexo I deste relatório.
2	Alta	Elaborar um plano de ação para garantia do cumprimento do cronograma no prazo previsto no termo de Compromisso, contemplando a paralisação das obras realizada em atendimento à exigência da ANM, ou informar se a paralisação solicitada pela ANM em Junho/22 não afeta o cronograma inicialmente previsto para a descaracterização.	28-abr-23	15-jul-23	Atendido	
3	Média	Informar a capacidade mensal de volume de rebeneficiamento de rejeito na usina de beneficiamento mineral.	28-abr-23	15-jul-23	Atendido	
4	Média	Caso alguma atividade não esteja com a aderência de sua execução em relação ao previsto, deve ser apresentado a justificativa da não aderência, e se necessário, apresentado plano de ação para garantia do cumprimento do cronograma.	28-abr-23	15-jul-23	Atendido	
5	Alta	Para o período de referência do relatório deverão ser apresentadas todas as atividades críticas consideradas no cronograma.	28-abr-23	15-jul-23	Atendido	
6	Média	Disponibilizar os relatórios analisados pela auditora, revisados, com as recomendações atendidas, ou, a justificativas para o não atendimento.	02-out-23	30-nov-23	Atendido	Atendido, conforme reunião de alinhamento realizada com a equipe da Intertechne no dia 08/01/2024.
7	Alta	Observa-se que não foram apresentadas alterações no cronograma macro de atividades em função do aumento do volume de rejeitos a serem escavados na descaracterização da Barragem B2 Auxiliar, resultante da remoção dos rejeitos remanescentes na margem esquerda, que apoiam o canal de cintura desta margem. Deste modo solicita-se esclarecimentos em relação a esta observação.	31-jul-24	31-out-24	Atendido	O cronograma macro de atividades da descaracterização não sofreu alterações mesmo com a mudança do projeto detalhado da Barragem B2A. A CSN Mineração trabalha com o objetivo de atender os prazos firmados e, portanto, até o momento não há relato a ser retratado sobre alterações deste cronograma macro.
8	Alta	Solicita-se que sejam enviadas as informações referentes aos tempos de ciclo dos trabalhos de escavação, transporte e descarga do material, ou informar o número de viagens/dia/caminhão, atualmente praticados.	21-jul-25	21-out-25	Atendido	Foi inserido o quantitativo de viagens no Item 1.7 do presente documento.

## 1.9. ASSINATURAS

Assinaturas de todos os responsáveis técnicos pelo projeto, pelo acompanhamento das obras e de quem elaborou o relatório técnico no período avaliado.

Portanto, sendo o que se cumpria para o momento, a Minérios Nacional permanece à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Congonhas, 24 de fevereiro de 2026.

DocuSigned by:

*RACHEL GONÇALVES BRAGA*

48837B3C47B8472...

Rachel Gonçalves Braga  
Responsável técnico pelo monitoramento,  
inspeção e manutenção da barragem

Assinado por:

*TADEU ANTONIO TORQUATO DE SOUZA JUNIOR*

88C6F9C69D8744B...

Tadeu Antônio Torquato de Souza Junior  
Responsável pela consolidação do relatório  
trimestral

Assinado por:

*JOÃO BATISTA DA SILVA*

24FB530EC461442...

João Batista da Silva  
Responsável área de Meio Ambiente

DocuSigned by:

*Henrile Pinheiro Meireles*

4FC6C319AE604EE...

Henrile Pinheiro Meireles  
Gerente Geral de Exploração Geológica

Assinado por:

*CLAUDIO MUSSO VELLOSO*

54738AF07D0B425...

Cláudio Musso Velloso  
Diretor de Produção

DocuSigned by:

*ENEAS GARCIA DINIZ*

A51397D1692E4B5...

Enéas Garcia Diniz  
Diretor Superintendente da Mineração

## **1.10. ANEXOS**

ANEXO I – Cronograma da implantação do projeto de descaracterização da Fase IV Etapa 2 da Barragem B2A.

REVISÕES							
Nº	DESCRIÇÃO	EMPRESA	OS	DESENHADO	VERIFICADO	APROVADO	DATA
0	EMISSÃO INICIAL	MIPE	-	GRO	FARM	TATSJ	24/02/2026
		ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	AUTORIZADO		DATA
		GRO	FARM	TATSJ	TATSJ		24/02/2026
		Nº DOCUMENTO:					REVISÃO
							00
				<p><b>ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA MINÉRIOS NACIONAL, NÃO PODENDO SER COPIADO, REPRODUZIDO E FORNECIDO A TERCEIROS SEM PRÉVIA E EXPRESSA AUTORIZAÇÃO.</b></p>			
<p><b>ANEXO I – CRONOGRAMA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B2 AUXILIAR</b></p> <p><b>BARRAGEM B2 AUXILIAR – COMPLEXO FERNANDINHO</b></p> <p><b>NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2025 E JANEIRO DE 2026</b></p>							
ELABORADO		TOTAL DE FOLHAS	ESCALA	FORMATO		REVISÃO	
Gabriela Rosa Oliveira		<b>01</b>	<b>S/ESC</b>	<b>A4</b>		<b>00</b>	
VERIFICADO							
Felipe Augusto Ribeiro de Matos							
APROVADO – DATA							
Tadeu Antônio Torquato de Souza Junior – 24/02/2026							

### Complexo Fernadinho fase IV etapa II

id	Nome da Tarefa	% previsto	% Trb. Concluído	In tend	Tér tend	2025												2026												2027								
						Semestre 1 2025						Semestre 2 2025						Semestre 1 2026						Semestre 2 2026						Semestre 1 2027			Semestre 2 2027					
						J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	
1	Obras de descaracterização da Barragem B2 Auxiliar [Complexo Fernadinho fase IV etapa II]	75%	100%	Seg 24/02/25	Qui 30/04/26																																	
2	Iniciação	100%	100%	Seg 24/02/25	Qua 12/11/25																																	
16	Marcos contratuais	71%	100%	Qui 06/03/25	Ter 30/12/25																																	
34	Mobilização	100%	100%	Qui 06/03/25	Seg 10/11/25																																	
54	Canteiro de obras	80%	100%	Qui 06/03/25	Sex 14/11/25																																	
68	Descaracterização da B2A	71%	100%	Qui 06/03/25	Ter 30/12/25																																	
1877	Desmobilização	0%	100%	Sex 28/11/25	Ter 30/12/25																																	
1882	Encerramento	0%	100%	Sex 28/11/25	Ter 30/12/25																																	

Projeto: Obras de descaracteriz Data: Qua 11/02/26
 
 Marco de Linha de Base Tarefa Resumo Divisão crítica Data limite Período chuvoso 

 Resumo da Linha de Base Marco Crítica Linha de Base Concluído

## Certificate Of Completion

Envelope Id: 7B7EA00B-950F-495B-ACBB-E89E0B2A5BD9

Subject: Relatório\_Recursos\_B2A\_Nov\_Dez\_25\_Jan\_26.pdf

Source Envelope:

Document Pages: 28

Certificate Pages: 5

AutoNav: Enabled

Envelopeld Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC-03:00) Brasilia

Status: Completed

Envelope Originator:

FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE MATOS

Av Brigadeiro Fari 3400, Grupo 1602

São Paulo, São Paulo 04538-132

felipe.matos@csn.com.br

IP Address: 45.161.209.19

## Record Tracking

Status: Original

2/20/2026 2:52:06 PM

Holder: FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE MATOS

felipe.matos@csn.com.br

Location: DocuSign

## Signer Events

CLAUDIO MUSSO VELLOSO

claudio.musso@csn.com.br

Diretor Produção

CSN MINERACAO SA \_ CMIN MATRIZ

Security Level: Email, Account Authentication (None)

## Signature

Assinado por:  
  
54738AF07D0B425...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 45.161.209.18

## Timestamp

Sent: 2/20/2026 2:57:11 PM

Resent: 2/23/2026 1:34:14 PM

Viewed: 2/23/2026 2:36:10 PM

Signed: 2/23/2026 2:36:26 PM

### Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via Docusign


ENEAS GARCIA DINIZ

eneas@csn.com.br

Diretor Superintendente

Csn

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
A51397D1692E4B5...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 177.27.13.36

Signed using mobile

Sent: 2/20/2026 2:57:12 PM

Resent: 2/23/2026 1:34:15 PM

Viewed: 2/23/2026 2:34:34 PM

Signed: 2/23/2026 2:34:38 PM

### Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 10/19/2018 1:31:39 PM

ID: 5efbd2b8-74fa-4503-932d-a72b274053d0

Henrile Pinheiro Meireles

henrile.meireles@csn.com.br

GG

CMIN

Security Level: Email, Account Authentication (None)

DocuSigned by:  
  
4FCC6319AE684EE...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 66.103.24.0

Sent: 2/20/2026 2:57:14 PM

Resent: 2/23/2026 1:34:15 PM

Resent: 2/23/2026 3:28:05 PM

Resent: 2/24/2026 7:59:29 AM

Viewed: 2/24/2026 1:08:38 PM

Signed: 2/24/2026 1:19:17 PM

### Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/24/2026 11:06:38 PM


ID: 52a71c4b-9f5d-4fe9-9a91-7d8fc02b7863

JOAO BATISTA DA SILVA

joao.silva@csn.com.br

Gerente de Projetos e Licenciamento Ambiental

Security Level: Email, Account Authentication (None)

Assinado por:  
  
24FB530EC461442...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 45.161.209.18

Sent: 2/20/2026 2:57:13 PM

Resent: 2/23/2026 1:34:16 PM

Resent: 2/23/2026 3:28:05 PM

Resent: 2/24/2026 7:59:30 AM

Viewed: 2/24/2026 11:06:13 AM

Signed: 2/24/2026 11:06:32 AM


### Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 2/24/2026 11:06:13 AM

ID: 253aa727-8dae-423c-b4bf-2ef8b3ba7ca0

Signer Events	Signature	Timestamp
<p>RACHEL GONCALVES BRAGA  rachel.braga@csn.com.br  Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<p>DocuSigned by:    46837B3C47B8472...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style  Using IP Address: 45.161.208.18</p>	<p>Sent: 2/20/2026 2:57:13 PM  Resent: 2/23/2026 1:34:16 PM  Resent: 2/23/2026 3:28:06 PM  Resent: 2/24/2026 7:59:30 AM  Viewed: 2/24/2026 8:23:29 AM  Signed: 2/24/2026 8:23:35 AM</p>

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 2/24/2026 8:23:29 AM  
ID: f0d8028a-b0aa-47b4-8615-75016ab302ea

<p>TADEU ANTONIO TORQUATO DE SOUZA JUNIOR  tadeu.junior@csn.com.br  Gerente de Projetos  CSN Mineração  Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<p>Assinado por:    80c6f9c69d8744b...</p> <p>Signature Adoption: Pre-selected Style  Using IP Address:  2803:9810:4b76:cf08:92d:7b62:e2cd:9006  Signed using mobile</p>	<p>Sent: 2/20/2026 2:57:14 PM  Resent: 2/23/2026 1:34:17 PM  Resent: 2/23/2026 3:28:06 PM  Resent: 2/24/2026 7:59:30 AM  Viewed: 2/24/2026 8:40:48 AM  Signed: 2/24/2026 8:41:21 AM</p>
--	--	---

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 2/24/2026 8:40:48 AM  
ID: 69673643-8cd3-4c99-a7d5-702656e6654b

In Person Signer Events	Signature	Timestamp
-------------------------	-----------	-----------

Editor Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------	--------	-----------

Agent Delivery Events	Status	Timestamp
-----------------------	--------	-----------

Intermediary Delivery Events	Status	Timestamp
------------------------------	--------	-----------

Certified Delivery Events	Status	Timestamp
---------------------------	--------	-----------

Carbon Copy Events	Status	Timestamp
--------------------	--------	-----------

<p>LEONARDO DA SILVA MACHADO  leonardo.smachado@csn.com.br  Esp. Engenharia 1  CMIN - MATRIZ  Security Level: Email, Account Authentication (None)</p>	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; color: blue;">COPIED</div>	<p>Sent: 2/20/2026 2:57:15 PM  Viewed: 2/20/2026 2:57:40 PM</p>
--	---	---

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Not Offered via DocuSign

Witness Events	Signature	Timestamp
----------------	-----------	-----------

Notary Events	Signature	Timestamp
---------------	-----------	-----------

Envelope Summary Events	Status	Timestamps
-------------------------	--------	------------

Envelope Sent	Hashed/Encrypted	2/20/2026 2:57:15 PM
Certified Delivered	Security Checked	2/24/2026 8:40:48 AM
Signing Complete	Security Checked	2/24/2026 8:41:21 AM
Completed	Security Checked	2/24/2026 1:19:17 PM

Payment Events	Status	Timestamps
----------------	--------	------------

Electronic Record and Signature Disclosure
--

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, COMPANHIA SIDERÁRGICA NACIONAL (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through your DocuSign, Inc. (DocuSign) Express user account. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. For such copies, as long as you are an authorized user of the DocuSign system you will have the ability to download and print any documents we send to you through your DocuSign user account for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of your DocuSign account. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use your DocuSign Express user account to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through your DocuSign user account all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact COMPANHIA SIDERÁŠRGICA NACIONAL:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [juliano.bortoluzzo@csn.com.br](mailto:juliano.bortoluzzo@csn.com.br)

**To advise COMPANHIA SIDERÁŠRGICA NACIONAL of your new e-mail address**

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [juliano.bortoluzzo@csn.com.br](mailto:juliano.bortoluzzo@csn.com.br) and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in DocuSign.

**To request paper copies from COMPANHIA SIDERÁŠRGICA NACIONAL**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to [juliano.bortoluzzo@csn.com.br](mailto:juliano.bortoluzzo@csn.com.br) and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with COMPANHIA SIDERÁŠRGICA NACIONAL**

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign account, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to [juliano.bortoluzzo@csn.com.br](mailto:juliano.bortoluzzo@csn.com.br) and in the body of such request you must state your e-mail, full name, IS Postal Address, telephone number, and account number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

**Required hardware and software**

Operating Systems:	Windows2000? or WindowsXP?
Browsers (for SENDERS):	Internet Explorer 6.0? or above
Browsers (for SIGNERS):	Internet Explorer 6.0?, Mozilla FireFox 1.0, NetScape 7.2 (or above)
Email:	Access to a valid email account
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Allow per session cookies</li> <li>•Users accessing the internet behind a Proxy Server must enable HTTP 1.1 settings via proxy connection</li> </ul>

\*\* These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, we will provide you with an email message at the email address we have on file for you at that time providing you with the revised hardware and software requirements, at which time you will have the right to withdraw your consent.

**Acknowledging your access and consent to receive materials electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I Agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify COMPANHIA SIDERÁŠRGICA NACIONAL as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by COMPANHIA SIDERÁŠRGICA NACIONAL during the course of my relationship with you.
